




COMUNE DI GONNOSFANADIGA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
PASSERELLE PEDONALI SUL RIO PIRAS.

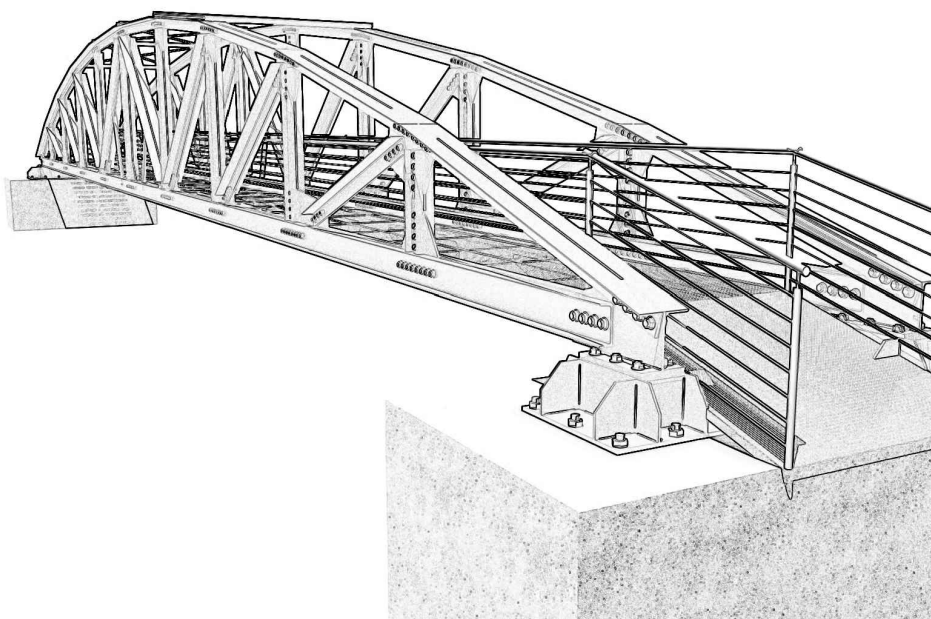

ELABORATI GRAFICI:

- GANTT + CRONOPROGRAMMA

STUDIO DI INGEGNERIA
&
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
ORC DESIGN

INGEGNERE CARLO ORRU^I


CELL: 3480503876

ALL. M

IL PROGETTISTA:

ING. CARLO ORRU^I

INGEGNERE CARLO ORRU^I



C)Diagramma di Gantt, completato per gli aspetti economici (espresso in migliaia di Euro)

COMUNE DI GONNOSFANADIGA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE PEDONALI SUL RIO PIRAS

PERIODI LAVORI	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE				TOT. LAVORAZIONI	%
Impianto cantiere																									0,00	0,00%
OS18 -A (€)	74333,330				74333,340				74333,330				74333,340				74333,330				74333,340				446 000,00	100,00%
TOT.MESE	74 333,33				74 333,34				74 333,33				74 333,34				74 333,33				74 333,34				446 000,00	EURO (€)
PARZIALE	16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%				16,67%					100%
PROGRES.	16,67%				33,33%				50,00%				66,67%				83,33%				100,00%					

Calendario **01/07/2024**

Primo giorno della settimana (Lun=2): 4

Attività		Inizio	Fine	Durata (Giorni)	% Compl.	Gg. Di lavoro	Giorni completi	Giorni Rimanent	03 - lug - 24	10 - lug - 24	17 - lug - 24	24 - lug - 24	31 - lug - 24	07 - ago - 24	14 - ago - 24	21 - ago - 24	28 - ago - 24	04 - set - 24	11 - set - 24	18 - set - 24	25 - set - 24	02 - ott - 24	09 - ott - 24	16 - ott - 24	23 - ott - 24	30 - ott - 24	06 - nov - 24	13 - nov - 24	20 - nov - 24	27 - nov - 24	04 - dic - 24	11 - dic - 24	18 - dic - 24	25 - dic - 24
1	ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	01/07/2024	22/07/2024	22	100%	16	22	0																										
1.1	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	01/07/2024	04/07/2024	4	100%	4	4	0																										
1.2	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	08/07/2024	10/07/2024	3	100%	2	3	0																										
1.3	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	11/07/2024	11/07/2024	1	100%	2	1	0																										
1.4	Montaggio del ponteggio metallico fisso	12/07/2024	15/07/2024	4	100%	2	4	0																										
1.5	Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	16/07/2024	16/07/2024	1	100%	2	1	0																										
1.6	Pulizia generale dell'area di cantiere	17/07/2024	22/07/2024	6	100%	2	6	0																										
2	RIMOZIONE DI OPERE IN LEGNO LAMELLARE	23/07/2024	10/09/2024	50	100%	36	50	0																										
2.1	Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	23/07/2024	10/09/2024	50	100%	36	50	0																										
3	OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO	14/09/2024	18/12/2024	96	100%	68	96	0																										
3.1	Montaggio di strutture reticolari in acciaio	14/09/2024	18/12/2024	96	100%	68	96	0																										
4	IMPIANTO ELETTRICO	18/12/2024	25/12/2024	8	100%	6	8	0																										
4.1	Realizzazione di impianto elettrico	18/12/2024	19/12/2024	2	100%	2	2	0																										
4.2	Realizzazione di impianto di massa a terra	20/12/2024	21/12/2024	2	100%	1	2	0																										
4.3	Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	22/12/2024	23/12/2024	2	100%	1	2	0																										
4.4	Installazione di corpi illuminanti	24/12/2024	25/12/2024	2	100%	2	2	0																										
5	S MOBILITO DEL CANTIERE	26/12/2024	27/12/2024	2	100%	2	2	0																										
5.1	Smobilizzo del cantiere	26/12/2024	27/12/2024	2	100%	2	2	0																										
		Inizio	Fine	GG																														
TOTALE		01/07/2024	27/12/2024	180																														
